Nome attività	Durata
Recinzione e apprestamenti del cantiere	14 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	4 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	6 g
Impianti di servizio del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Opere Edili: Terrazzi e Prospetto	27 g
Rimozione di pavimento su balconi e logge	4 g
Rimozione di massetto	4 g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	3 g
Posa di pavimenti per esterni in ceramica	6 g
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro	5 g
Formazione intonaci esterni tradizionali	6 g
Tinteggiatura di superfici esterne	4 g
Pareti divisorie, controsoffittature	5 g
Adeguamento controsoffitti	5 g
Infissi Esterni	15 g
Smontaggio degli infissi da sostituire	5 g
Montaggio di serramenti esterni	10 g
Distribuzioni	15 g
Cablaggio elettrico	5 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	6 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san	7 g
Intonaci e pitturazioni interne	19 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	10 g
Tinteggiatura di superfici interne	9 g
Apparecchiature d'impianto	20 g
Installazione di pompa di calore	20 g
Smobilizzo del cantiere	10 g
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materia	5 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g
Smobilizzo del cantiere	3 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = AREA DI CANTIERE ESTERNA	
Z2 = PROSPETTO ESTERNO	
Z3 = AREE INTERNE	
Z4 = AREA TERRAZZI	

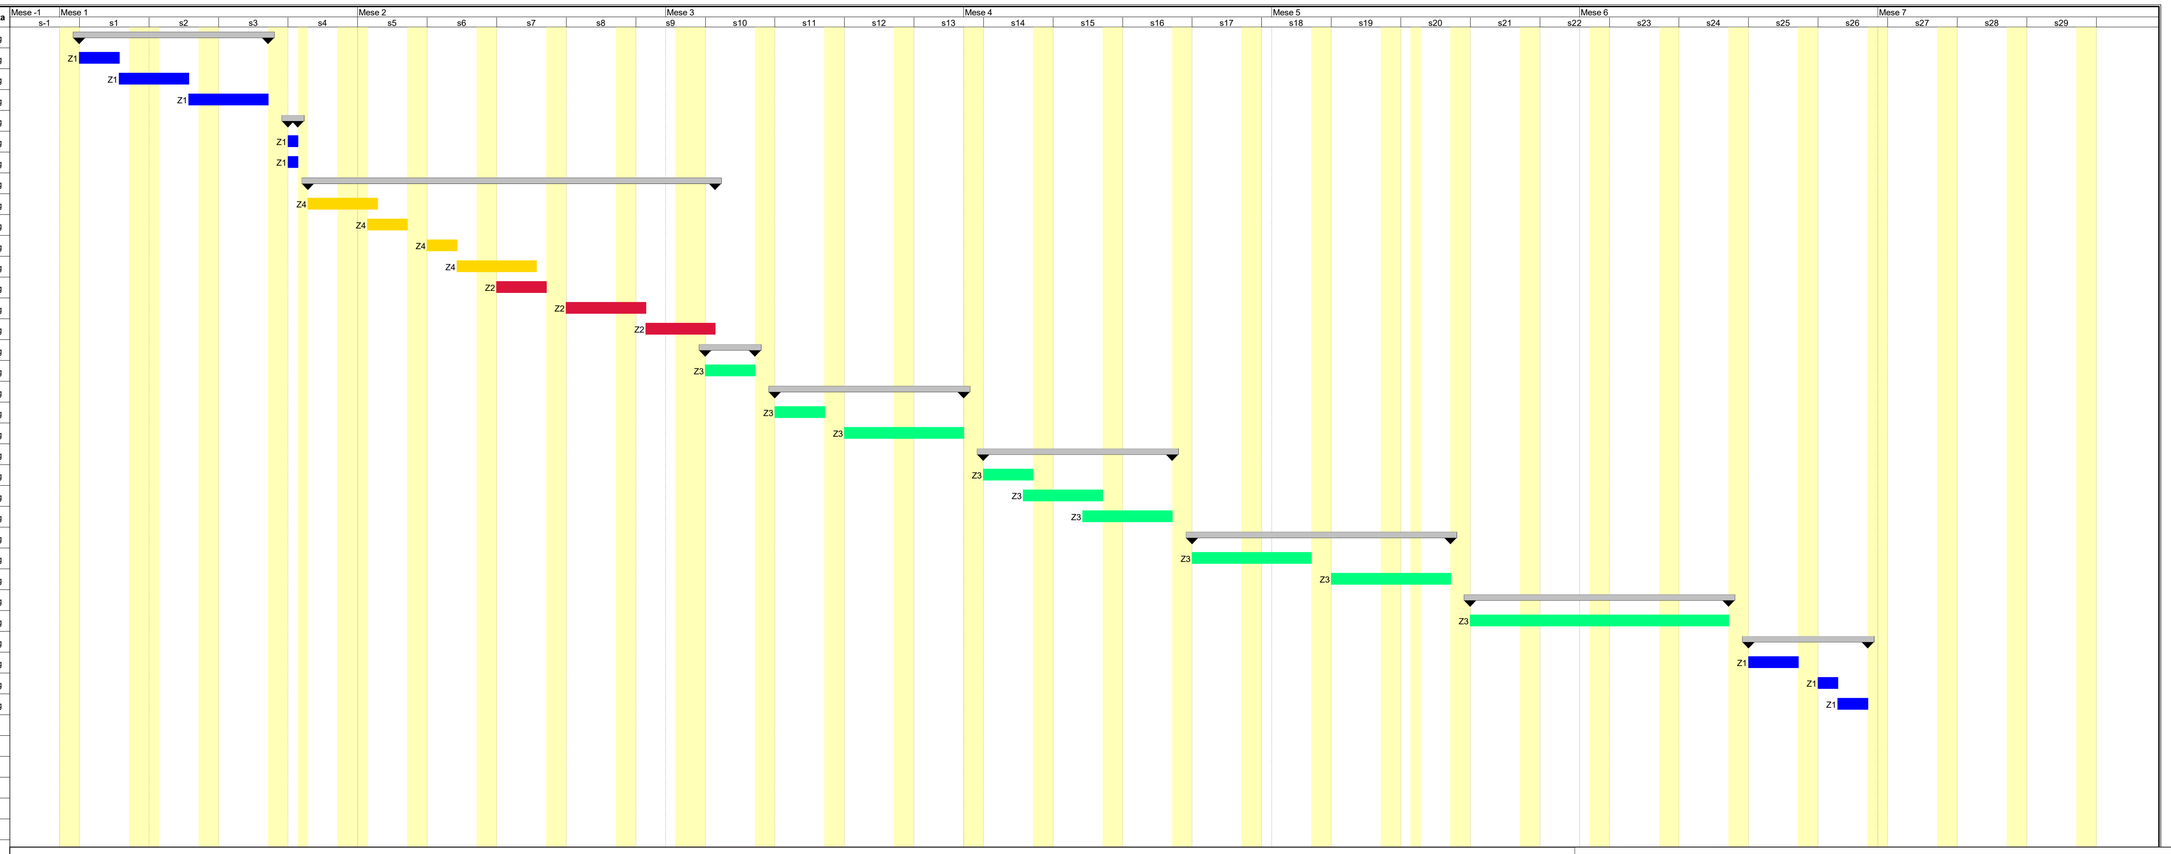

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Recinzione e apprestamenti del cantiere				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	4	4
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	4	7
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	6	8
Impianti di servizio del cantiere				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	1	1
Opere Edili: Terrazzi e Prospetto				
Rimozione di pavimento su balconi e logge	4	1	4	7
Rimozione di massetto	4	1	4	4
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	4	1	3	3
Posa di pavimenti per esterni in ceramica	4	1	6	8
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro	2	1	5	5
Formazione intonaci esterni tradizionali	2	1	6	8
Tinteggiatura di superfici esterne	2	1	4	7
Pareti divisorie, controsoffittature				
Adeguamento controsoffitti	3	2	5	5
Infissi Esterni				
Smontaggio degli infissi da sostituire	3	3	5	5
Montaggio di serramenti esterni	3	3	10	12
Distribuzioni				
Cablaggio elettrico	3	2	5	5
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	3	2	6	8
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	3	2	7	9
Intonaci e pitturazioni interne				
Formazione intonaci interni (tradizionali)	3	1	10	12
Tinteggiatura di superfici interne	3	1	9	12
Apparecchiature d'impianto				
Installazione di pompa di calore	3	2	20	26
Smobilizzo del cantiere				
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	5	5
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	2	2
Smobilizzo del cantiere	1	1	3	3

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = AREA DI CANTIERE ESTERNA

2) = PROSPETTO ESTERNO

3) = AREE INTERNE

4) = AREA TERRAZZI

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Edile

2) = Impresa Impianti

3) = Impresa Serramenti

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Direzione per l'Edilizia Scolastica
e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE,

PROGETTO ESECUTIVO

VISTI E PARERI

CRONOPROGRAMMA

DATA:

IL PROGETTISTA
Arch. Gandolfo Antonio Lima

VISTO:
IL R.U.P.
Ing. Valerio Randazzo
